


Contrato: LP-SID-UAC-025-2022

# CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE MOVIMIENTO DE MASAS EN EL CERRO DE LA POPA LADERA DEL SALTO DEL CABRÓN.

ACTIVIDADES DE

CERRO DE LA POPA

Extensión aproximada de 10 hectáreas

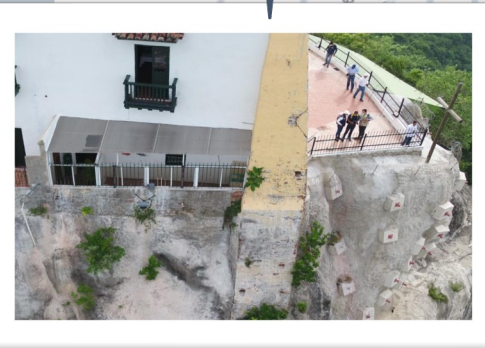

VALOR DEL CONTRATO OBRA

## \$ 6.614.228.791

Contratista: CONSORCIO OBRAS DE MITIGACIÓN 22

- FECHA DE INICIO: 01 de SEPT de 2022 (240 días)
- FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 de ABRIL 2023
- FECHA DE REINICIO: 28 de AGOST de 2023 (120 días)

Duración total  
**360**  
Días

- FECHA DE SUSPENSIÓN 2 : 26 de DIC de 2023

VR. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

## \$655.723.320

Contratista: Ingenieros Civiles Cobrado: \$341.894.139  
Especialistas S.A.S ICE

### ENTREGABLES:

1 Muro en concreto lanzado con anclajes activos

2 Protección del talud con pernos pasivos , instalación de malla y concreto lanzado e instalaciones de drenes

3 Muros en concreto reforzado

4 Revegetalización

5 Estructuras hidráulicas recolectoras

5.1 Piscina sedimentadora

5.2 Sumidero con desarenador (ejecutado)

5.3 Sumidero transversal

5.4 Tubería estructural PVC 700 mm

5.5 Canal bajo andén

CERRO DE LA POPA LADERA DEL SALTO DEL CABRÓN - DISTRITO DE CARTAGENA

Sistema de contratación: SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

ENTIDAD CONTRATANTE

Fuente de financiación Regalías



Secretaría de Infraestructura Distrital

Contrato: LP-SID-UAC-025-2022

ACTIVIDADES DE

el arte del sabc

# CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE MOVIMIENTO DE MASAS EN EL CERRO DE LA POPA LADERA DEL SALTO DEL CABRÓN.

CERRO DE LA POPA

Extensión aproximada de 10 hectáreas



## ESTADO DE AVANCE

Avance Programado

100%

Avance Ejecutado

75.4%

Avance Facturado

52.19%

Monto Facturado

\$ 3.448.623.414

## SITUACIONES RELEVANTES PRESENTADAS :

- Prorroga y ajuste debido a cambios morfológicos en los sitios a intervenir
- Oposición por parte de la comunidad a las obras de estructuras hidráulicas.

## OBJETIVOS:

### ● Recuperar

El área natural de bosque y ecosistema

La capa vegetal debilitada por deforestación e intervención de drenajes

### ● Mitigar

El proceso de erosión en la parte baja e intermedia de la ladera

### ● Disminuir

La intervención antrópica por la construcción de viviendas

### ● Intervenir

Las áreas con presencia de materiales muy propensos a la erosión

CERRO DE LA POPA LADERA DEL SALTO DEL CABRÓN - DISTRITO DE CARTAGENA

Sistema de contratación: SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

ENTIDAD CONTRATANTE

Fuente de financiación Regalías



Secretaría de  
**Infraestructura  
Distrital**

Contrato: LP-SID-UAC-025-2022

ACTIVIDADES DE

el arte del sabc

# CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE MOVIMIENTO DE MASAS EN EL CERRO DE LA POPA LADERA DEL SALTO DEL CABRÓN.

Extensión aproximada de 10 hectáreas

CERRO DE LA POPA



Recursos no comprometidos del proyecto

## \$ 1.101.844.018



## Actividades de control a la ejecución del proyecto

- 1 Verificación del cumplimiento de cronograma  
Afiliaiones al sistema de SST.
  - 2 Acompañamiento en labores de socialización del proyecto
  - 3 Supervisión de la ejecución de las obras ejecutadas por el contratista
- Tensionamiento de anclajes activos
  - Perforación para colocación de anclajes pasivos y drenes horizontales
  - Inyección de anclajes pasivos
  - Colocación de concreto lanzado
  - Fundida de pilotes
  - Colocación de acero de refuerzo
  - Actividades de Revegetalización

CERRO DE LA POPA LADERA DEL SALTO DEL CABRÓN - DISTRITO DE CARTAGENA

Sistema de contratación: SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

ENTIDAD CONTRATANTE

Fuente de financiación Regalías



Secretaría de  
**Infraestructura  
Distrital**
